Detail 5.3.7.2 M 1:10

Innenwand an Innenwand: iwrx-iwrx002

Horizontalschnitt
Innenwand mit Rahmenwerk
einschalig, einfach beplankt
Beplankung: Gipsfaserplatte - aussteifend

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Innenwand: iwrxxoXXXa

(114) 60/b mm zusätzlicher Wandstiel *)
(114a) 60/b mm zusätzlicher Innenwandstiel - nur bei Variante B (s.u.)
(511) 6,0 x ... mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm

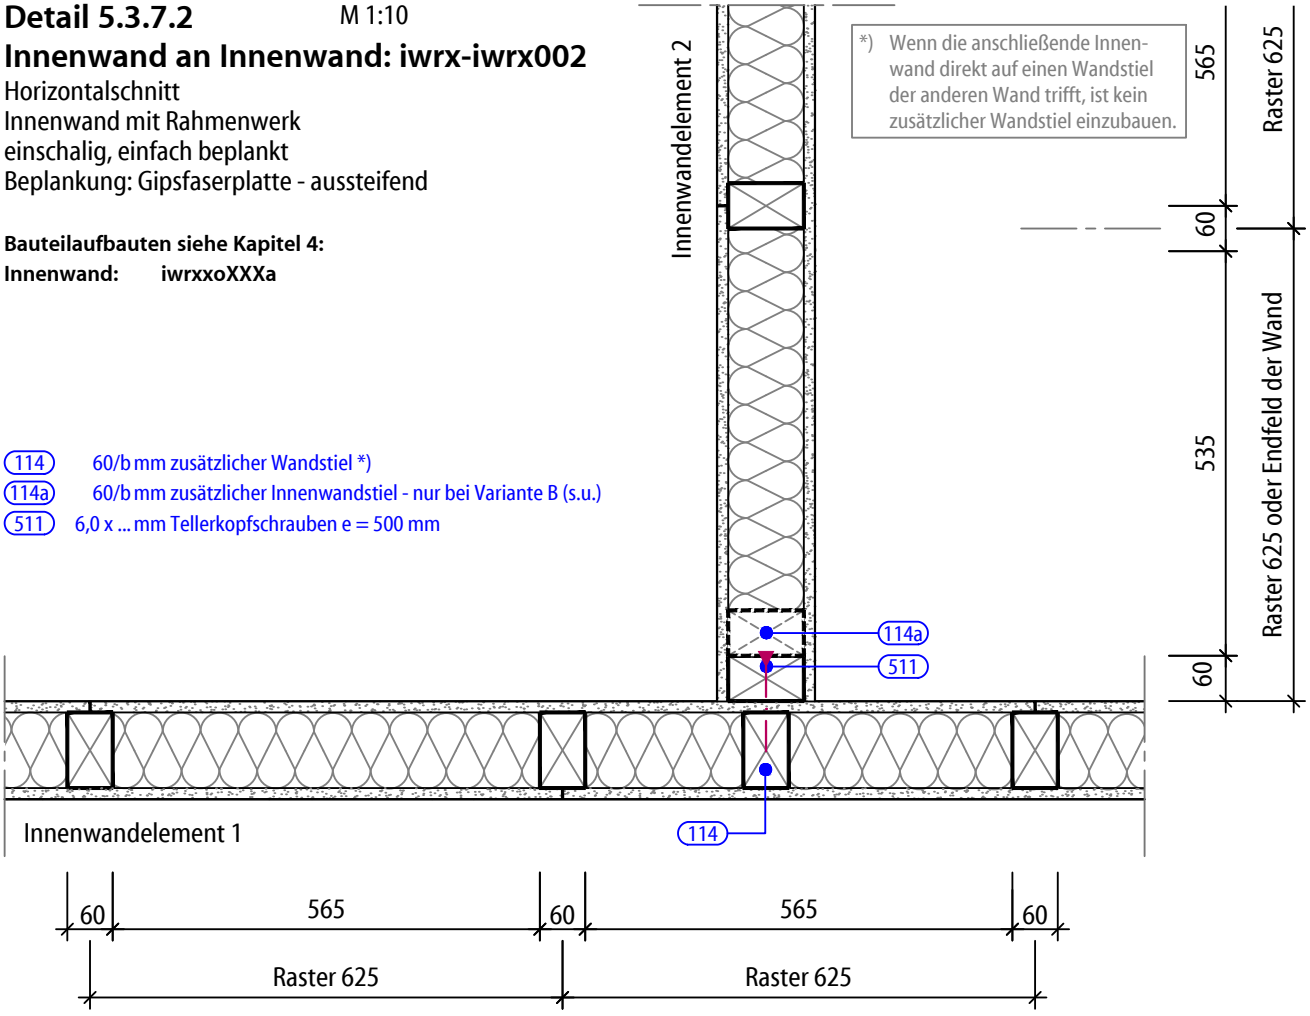

Montagereihenfolge M 1:20
Variante A) ungedämmte, einseitig geschlossene Innenwände:
1 Innenwandelement 2 an Innenwandelement 1 stellen und ausrichten
2 durch Innenwandstiel verschrauben
3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
4 offene Seite beplanken (Gipsfaserplatte) und Verspachtelung

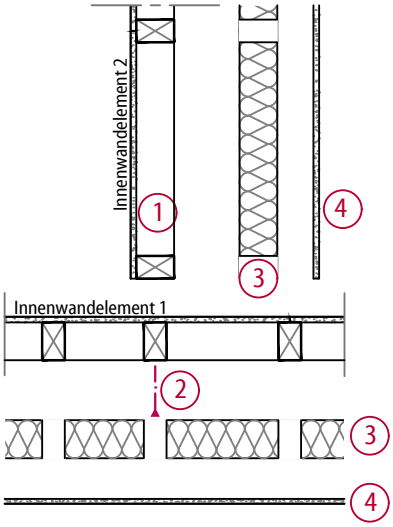
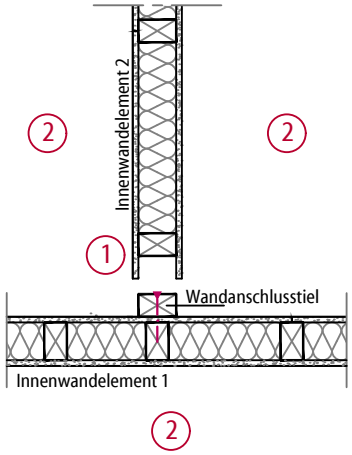
Montagereihenfolge M 1:20
Variante B) vorgefertigte gedämmte, beidseitig geschlossene Innenwände:
1 Innenwandelement 2 auf Wandanschlussstiel des Innenwandelements 1 schieben und Wandverbindung über Verklammerung des Plattenüberstandes herstellen
2 Verspachtelung
